

Genova, 2 maggio 2019

REGIONE LIGURIA

Comune di Genova

Città Metropolitana di Genova

Associazione Temporanea d'Impresa

**Fratelli Omini S.p.A. (mandataria), Fagioli S.p.A., IREOS
S.p.A. e I.P.E. Progetti s.r.l.**

Cantiere “PONTE MORANDI”

Rapporto di Monitoraggio In Operam

Fibre amianto aerodisperse

Postazioni Ponente A1-A2

dal: 23/04/2019

al: 29/04/2019

SOMMARIO

DESCRIZIONE POSTAZIONI	3
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	4
RISULTATI POSTAZIONE A1 - MONTE ANSALDO	5
RISULTATI POSTAZIONE A2 - VALLE BIC.....	6

DESCRIZIONE POSTAZIONI

Nella Figura 1 seguente è riportata l'ubicazione delle postazioni del cantiere di ponente così definite:

- Postazione A1: Postazione a monte di ponente (44.428180, 8.884375) – posizionata in zona Ansaldo, nell'area di proprietà Ansaldo e ceduta alla Struttura Commissariale, V parcheggio sulla destra.
- Postazione A2: Postazione a valle di ponente – posizionata in Area BIC

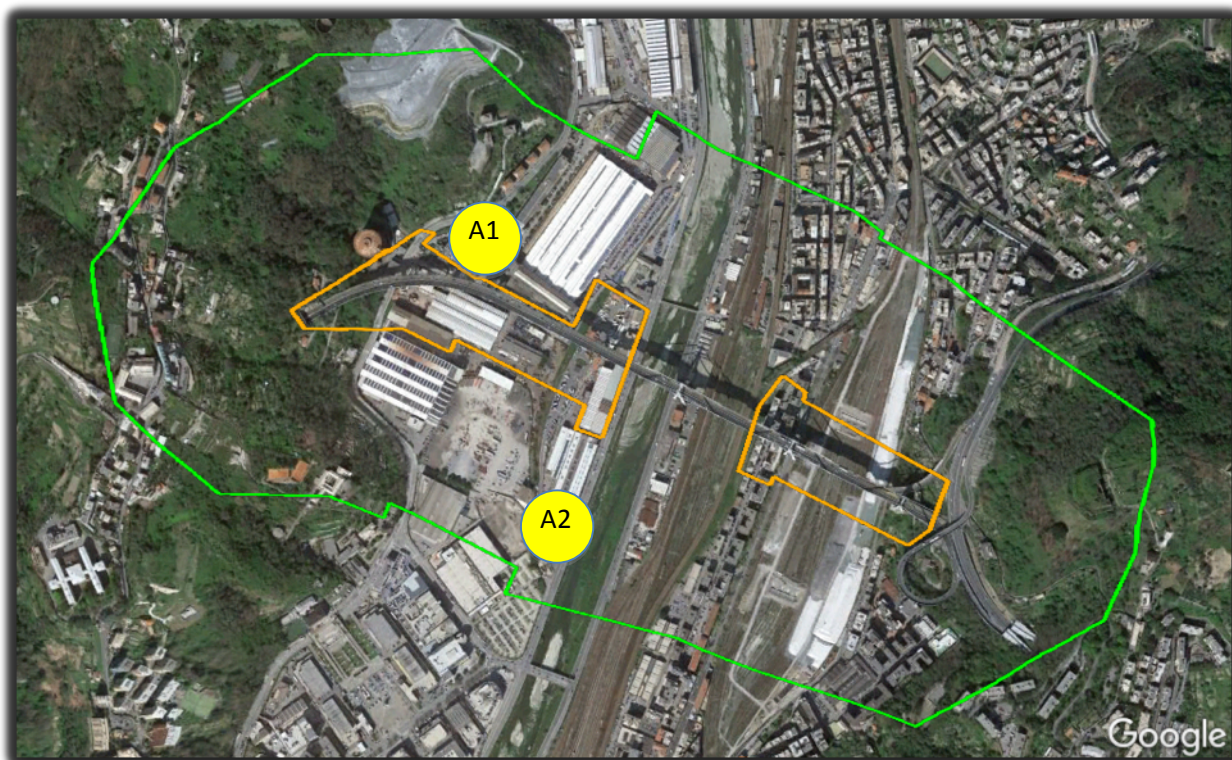


Figura 1 – Ubicazione punti di monitoraggio fibre aerodisperse – Cantiere Ponente – A1- A2

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

I campionamenti sono stati effettuati utilizzando un campionatore ad alto volume con una membrana in policarbonato avente diametro 25 mm e porosità 0,8 µm, applicando un flusso pari a 10 l/min per un totale di circa 3000 litri.

Nella Foto n. 1 si riporta il campionatore portatile ad alto volume utilizzati per i suddetti campionamenti.



Foto n. 1 – Campionatore MegaSystem Life One

RISULTATI

Nella Tabella 1 seguente si riportano i risultati dei monitoraggi in operam del Cantiere di Ponente nella postazione A1 nel periodo indicato

Data campionamento	Concentrazione fibre aerodisperse (ff/l)	N. Rapporto di prova
23.04.2019	< 0,1	19LA08969
24.04.2019	< 0,1	19LA09053
25.04.2019 07:00-18:00	< 0,1	19LA09057
25.04.2019 18:50-05:50	< 0,1	19LA09061
26.04.2019	< 0,1	19LA09171
27.04.2019	< 0,1	19LA09174
28.04.2019	< 0,1	19LA09176
29.04.2019 08:00-18:00	< 0,1	19LA09384
29.04.2019 20:00-07:00	< 0,1	19LA09380

Tabella 1 – Risultati Postazione A1 a Nord (Ansaldo) (44.428180 N, 8.884375 E)

Nella Tabella 2 seguente si riportano i risultati dei monitoraggi In Operam del Cantiere di Ponente nella postazione A2

Data campionamento	Concentrazione fibre aerodisperse (ff/l)	N. Rapporto di prova
23.04.2019	< 0,1	19LA08970
24.04.2019	-	Mancanza corrente
25.04.2019 07:00-18:00	< 0,1	19LA09058
25.04.2019 19:00-06:00	< 0,1	19LA09062
26.04.2019	< 0,1	19LA09170
27.04.2019	-	Mancanza corrente
28.04.2019	-	Mancanza corrente
29.04.2019 09:00-18:00	< 0,1	19LA09387
29.04.2019 20:00-07:00	< 0,1	19LA09381

Tabella 2 – Risultati Postazione A2 a Sud (BIC) (44.425321 N, 8.885691 E)

”

IREOS S.p.A.
Dott. Paolo Petit-Bon

