

Genova, 24 luglio 2019

REGIONE LIGURIA

Comune di Genova

Città Metropolitana di Genova

Associazione Temporanea d'Impresa

**Fratelli Omini S.p.A. (mandataria), Fagioli S.p.A., IREOS
S.p.A. e I.P.E. Progetti s.r.l.**

Cantiere “PONTE MORANDI”

Rapporto di Monitoraggio In Operam

Fibre amianto aerodisperse

Postazioni Levante A3–A4

dal: 15/07/2019

al: 21/07/2019

SOMMARIO

DESCRIZIONE POSTAZIONI	3
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	4
RISULTATI POSTAZIONE A3 - MONTE RAMPA TERRAPIENO VERGANO	5
RISULTATI POSTAZIONE A4 - VALLE VIA PORRO	6

DESCRIZIONE POSTAZIONI

Nella Figura 1 seguente è riportata l'ubicazione delle postazioni del cantiere di levante così definite:

- Postazione A3: Postazione a monte di levante (lato cantiere Ovest) (44.425934 N, 8.890475 E) – posizionata sulla rampa di accesso al Vergano (terrapieno), adiacente al muro di separazione della vecchia ferrovia.
- Postazione A4: Postazione a valle di levante (lato cantiere Ovest) (44.424376 N, 8.889742 E) - ubicata in Via Porro (circa civico 3) sul lato destro a scendere sul mare, sul manto stradale.

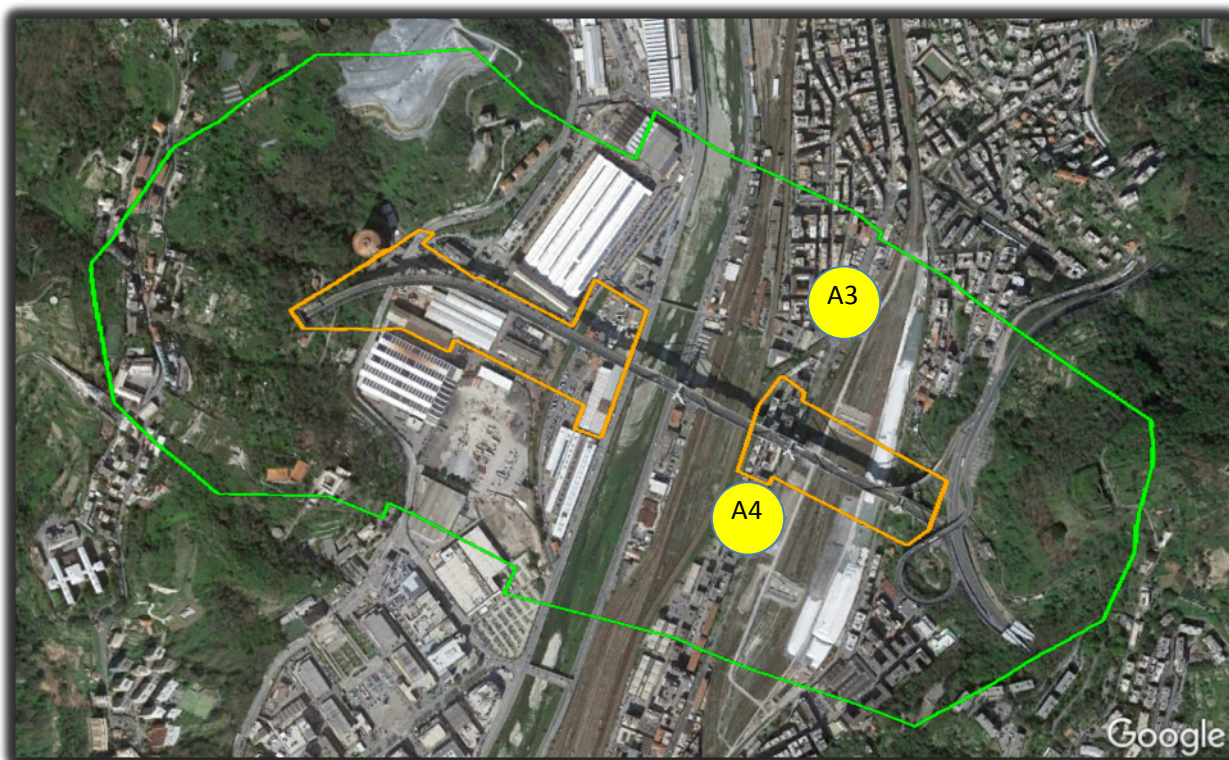


Figura 1 – Ubicazione punti di monitoraggio fibre aerodisperse – Cantiere Levante – A3- A4

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

I campionamenti sono stati effettuati utilizzando un campionatore ad alto volume con una membrana in policarbonato avente diametro 25 mm e porosità 0,8 μm , applicando un flusso pari a 10 l/min per un totale di circa 3000 litri.

Nella Foto n. 1 si riporta il campionatore portatile ad alto volume utilizzati per i suddetti campionamenti.



Foto n. 1 – Campionatore MegaSystem Life One

RISULTATI

Nella Tabella 1 seguente si riportano i risultati dei monitoraggi In Operam del Cantiere di Levante nella postazione A3

Data campionamento	Concentrazione fibre aerodisperse (ff/l)	N. Rapporto di prova
15.07.2019	< 0,1	19LA16493
16.07.2019	< 0,1	19LA16617
17.07.2019	< 0,1	19LA16734
18.07.2019	< 0,1	19LA16873
19.07.2019	< 0,1	19LA16997
20.07.2019	< 0,1	19LA17011
21.07.2019	< 0,1	19LA17023

***Tabella 1 – Risultati Postazione A3 a monte di levante (lato cantiere Ovest)
(44.425934 N, 8.890475 E)***

Nella Tabella 2 seguente si riportano i risultati dei monitoraggi In Operam del Cantiere di Levante nella postazione A4

Data campionamento	Concentrazione fibre aerodisperse (ff/l)	N. Rapporto di prova
15.07.2019	< 0,1	19LA16494
16.07.2019	< 0,1	19LA16618
17.07.2019	< 0,1	19LA16733
18.07.2019	< 0,1	19LA16874
19.07.2019	< 0,1	19LA16998
20.07.2019	< 0,1	19LA17012
21.07.2019	< 0,1	19LA17024

Tabella 2 – Risultati Postazione A4 a valle di levante (lato cantiere Ovest)
(44.424376 N, 8.889742 E)

IREOS S.p.A.
Dott. Paolo Petit-Bon

